


# 旧焼却施設解体工事 工事進捗状況（令和4年12月度）

写真の撮影箇所



○煙突（全長 45m）の人力解体を行いました。  
 概ね 30mをエアピックにて解体し、囲いの足場を撤去しました。  
 1～3月中旬まで休工となります。  
 （進捗率 64%）

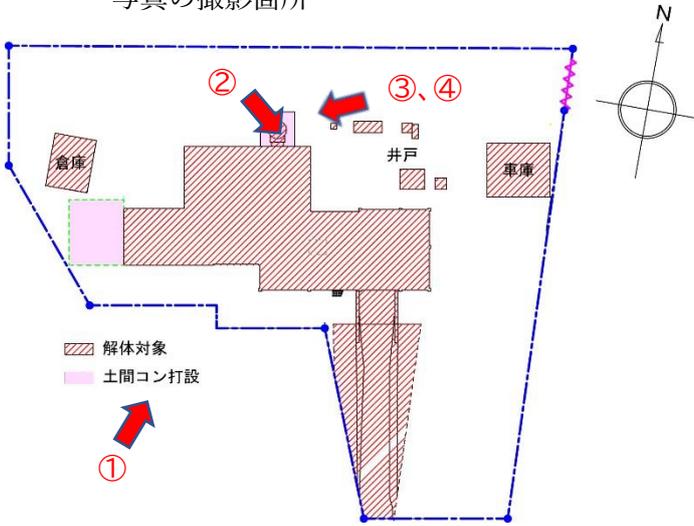

建屋南面 外観



煙突人力解体状況



囲い足場撤去状況



作業完了状況

進捗率 (64%)

