


旧焼却施設解体工事 工事進捗状況（令和4年6月度）

写真の撮影箇所

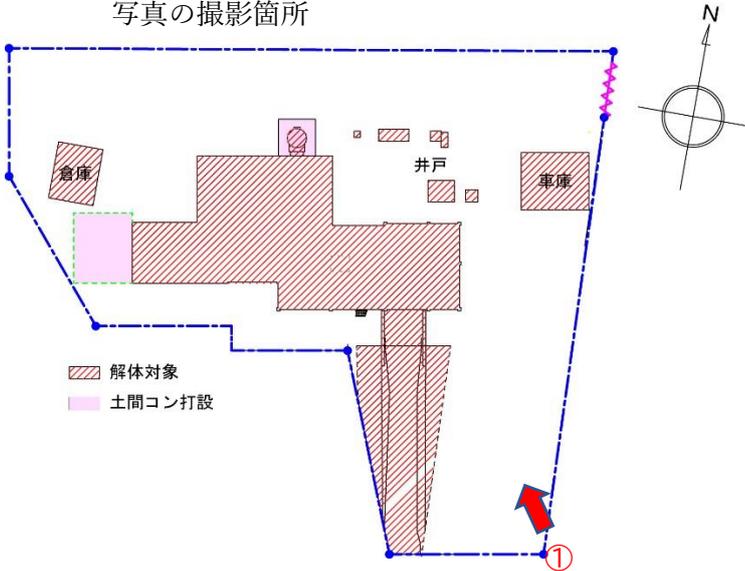

○今後の流れとしては対象施設について、左記の青点線の部分に仮囲いを設置します。

建屋と煙突は、ダイオキシン類が外部に漏れ出ないように密閉化（養生）を行い、ダイオキシン類等の除染作業を行っていきます。

（現在の進捗率0%）



仮囲い・養生前の解体対象全景
（南東方向より撮影）

撮影地点付近に現場事務所を設営する予定となっております。

工期は令和5年7月31日まで。
年内は主に除染作業、来春より解体撤去が本格的となります。1～3月は積雪のため休工予定。

進捗率

