


令和7年1月末現在建設工事進捗状況

工事名称	(仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事			
工事場所	北海道名寄市字大橋140番地1及び146番地11			
敷地面積	13,742.56 m ²			
構造及び規模	鉄骨造、一部RC・SRC造、地上5階建			
建築面積/延床面積	2,705.43 m ² / 5,012.34 m ²			
契約工期	令和5年9月25日 から 令和9年3月12日 まで			
【今月の主な作業】				
<ul style="list-style-type: none"> ・基礎地中梁型枠取り付け、H鋼親杭引抜、採暖養生 ・基礎地中梁鉄筋・型枠取り付け ・コンクリート打設、打設部採暖、打設部型枠解体（強度試験結果確認） 				
実施出来高	9.73%	作業人員累計	月計 812 人	累計 3,800 人

撮影箇所：①東面上空



工事記録写真（撮影日：令和7年1月31日）

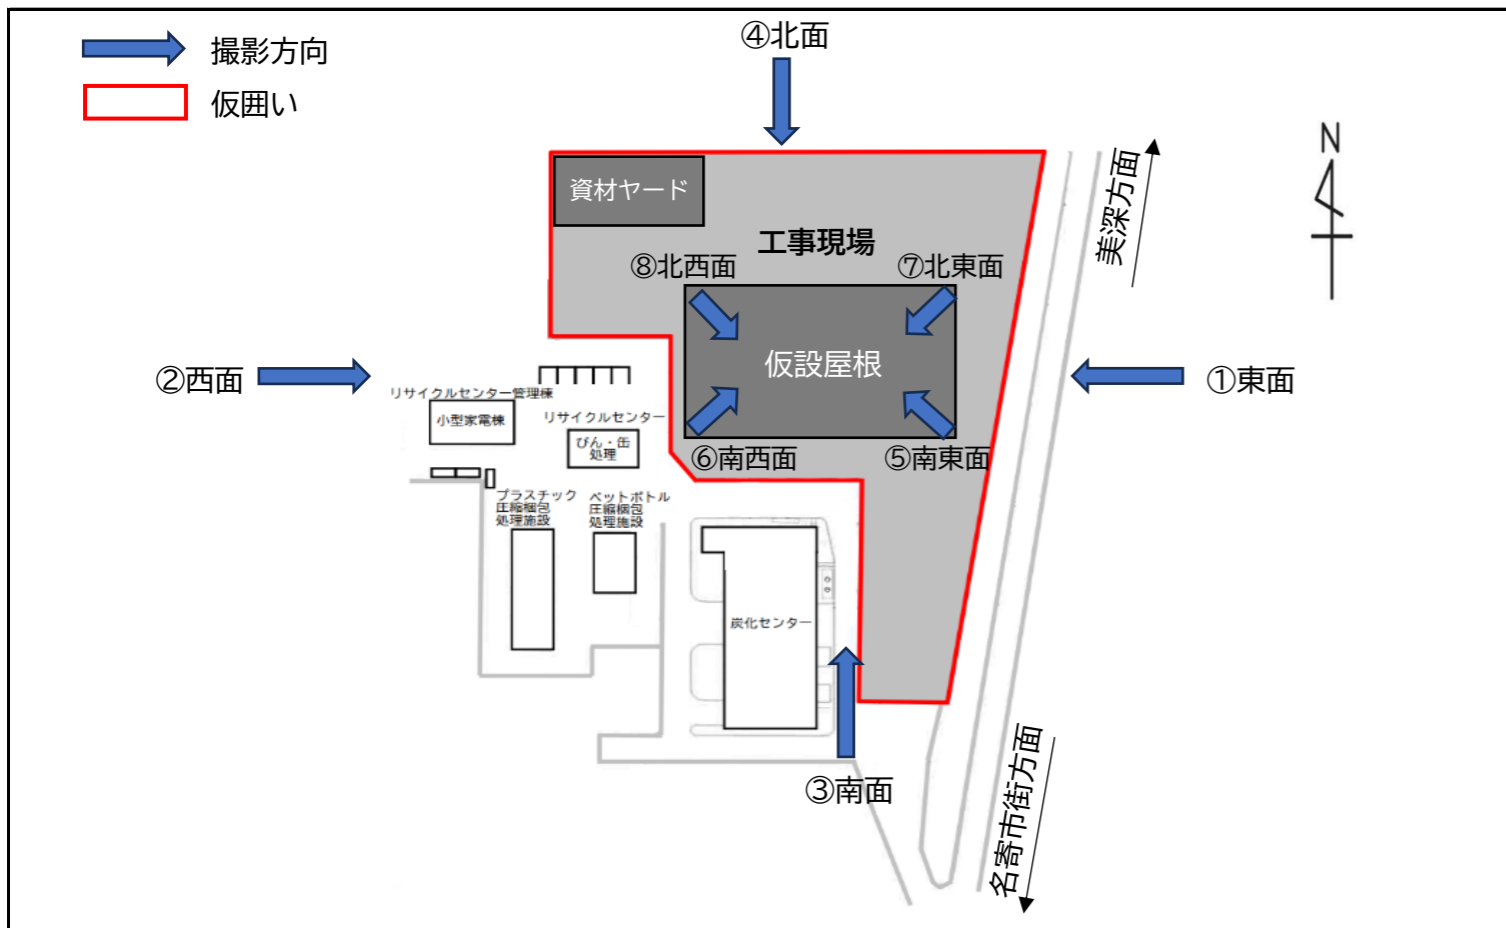

撮影箇所：②西面上空



令和7年1月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：③南面上空



撮影箇所：④北面上空



撮影箇所：⑤南東面仮設内部



撮影箇所：⑥南西面仮設内部



令和7年1月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：⑦北東面仮設内部



撮影箇所：⑧北西面仮設内部

