

令和7年3月末現在建設工事進捗状況

工事名称	(仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事
工事場所	北海道名寄市字大橋140番地1及び146番地11
敷地面積	13,742.56 m ²
構造及び規模	鉄骨造、一部RC・SRC造、地上5階建
建築面積/延床面積	2,705.43 m ² / 5,012.34 m ²
契約工期	令和5年9月25日 から 令和9年3月12日 まで

【今月の主な作業】


- ・採暖養生、埋め戻し、脱枠、グレーチング枠取付
- ・基礎地中梁出来形検査
- ・土間配筋、土間スラブ止枠
- ・配筋立会検査
- ・砕石上屋解体
- ・排水溝アングル取付、水槽廻り止め枠、排水溝底盤打設
- ・側溝止め枠、採暖養生段取り
- ・生コン受入検査、土間コンクリート打設、打設部採暖
- ・機械基礎配筋、アングル取付

実施出来高	11.36%	作業人員累計	月計 700 人	累計 5,244 人
-------	--------	--------	----------	------------

撮影箇所：①東面上空



工事記録写真（撮影日：令和7年3月31日）

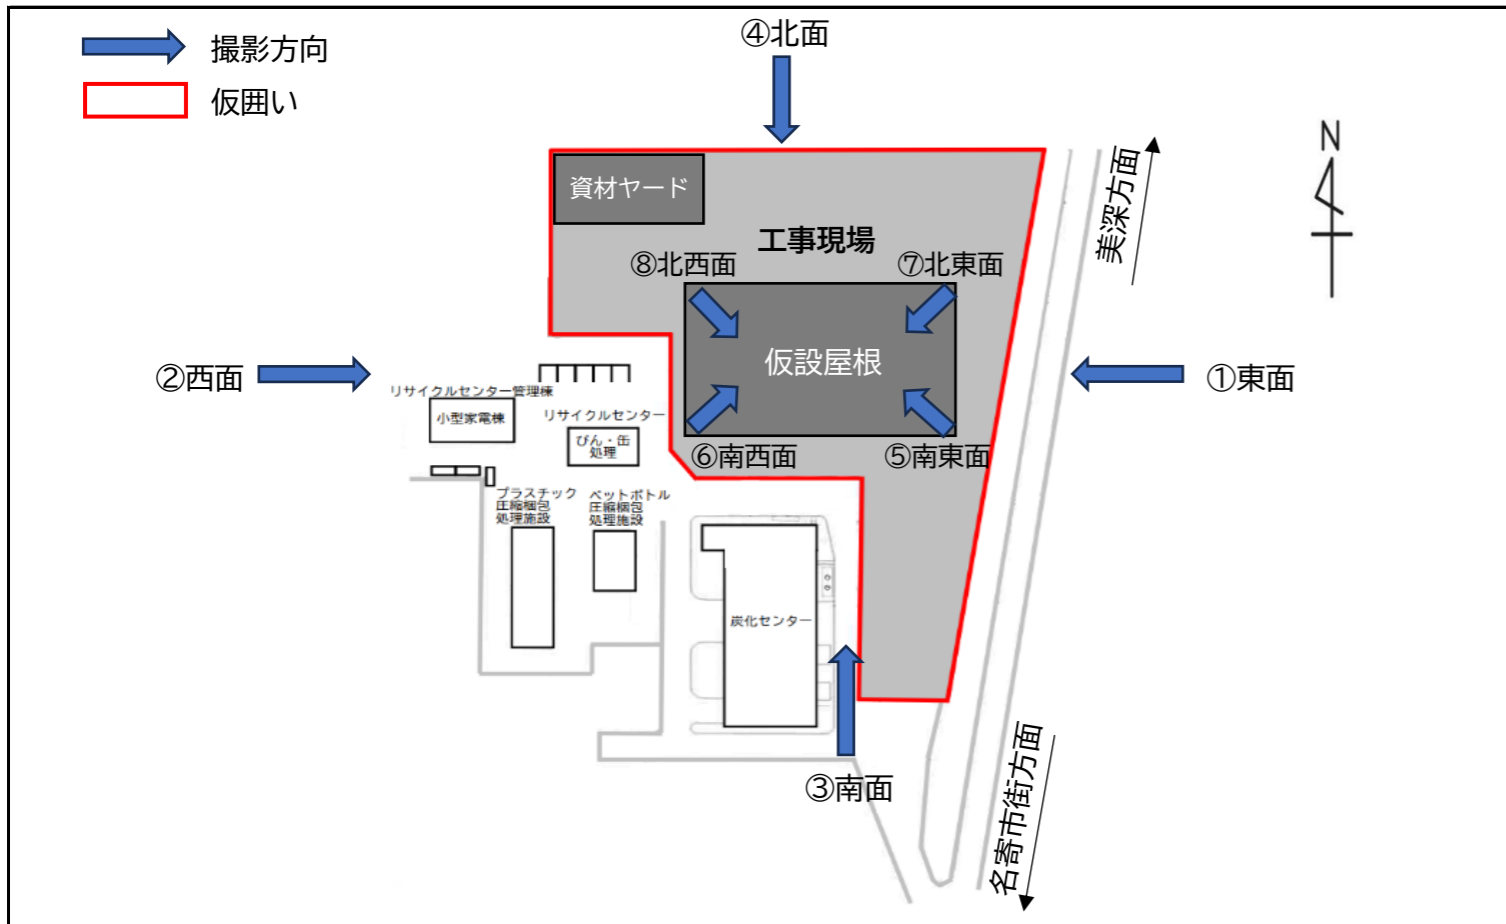

撮影箇所：②西面上空



令和7年3月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：③南面上空



撮影箇所：④北面上空



撮影箇所：⑤南東面仮設内部



撮影箇所：⑥南西面仮設内部



令和7年3月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：⑦北東面仮設内部



撮影箇所：⑧北西面仮設内部

