

令和6年6月末現在建設工事進捗状況

工事名称	(仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事
工事場所	北海道名寄市字大橋140番地1及び146番地11
敷地面積	13,742.56 m ²
構造及び規模	鉄骨造、一部RC・SRC造、地上5階建
建築面積/延床面積	2,705.43 m ² / 5,012.34 m ²
契約工期	令和5年9月25日 から 令和9年3月12日 まで

【今月の主な作業】

[準備工]


- ・ 場内敷地不陸整正、素掘り側溝埋め及び新設
- ・ 場内敷地砕石敷均し
- ・ 建屋位置測量
- ・ 歩道切下げ工事
- ・ 仮囲い組立

月末出来高	予定	0.64%	実施	0.64%	作業人員累計	月計	174人	累計	174人
-------	----	-------	----	-------	--------	----	------	----	------

撮影箇所：①東面上空



工事記録写真（撮影日：令和6年6月30日）

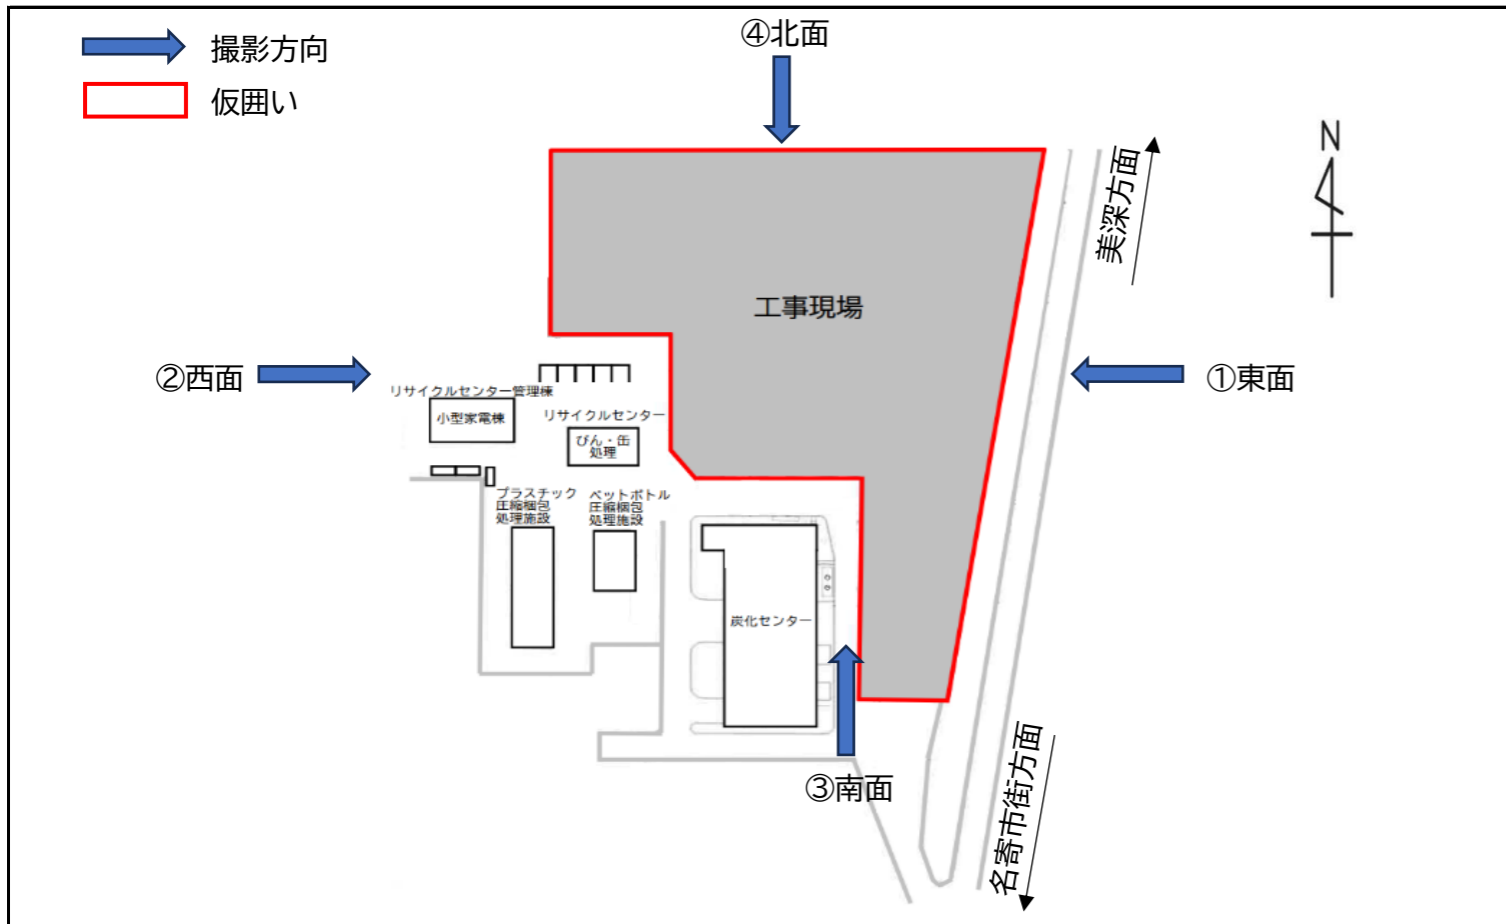

撮影箇所：②西面上空



令和6年6月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：③南面上空



撮影箇所：④北面上空

