

令和6年10月末現在建設工事進捗状況

| | |
|-----------|---|
| 工事名称 | (仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事 |
| 工事場所 | 北海道名寄市字大橋140番地1及び146番地11 |
| 敷地面積 | 13,742.56 m ² |
| 構造及び規模 | 鉄骨造、一部RC・SRC造、地上5階建 |
| 建築面積/延床面積 | 2,705.43 m ² / 5,012.34 m ² |
| 契約工期 | 令和5年9月25日 から 令和9年3月12日 まで |

【今月の主な作業】


- ・捨てコンクリート枠取付・打設・枠解体
- ・墨出し、アンカーフレーム取付、地足場組立
- ・杭補修部鉄筋組立・型枠組立、杭補修部コンクリート打設
- ・耐圧盤鉄筋組立・型枠組立

| | | | | |
|-------|-------|--------|---------|-----------|
| 実施出来高 | 6.88% | 作業人員累計 | 月計 541人 | 累計 1,668人 |
|-------|-------|--------|---------|-----------|

撮影箇所：①東面上空



工事記録写真（撮影日：令和6年10月31日）

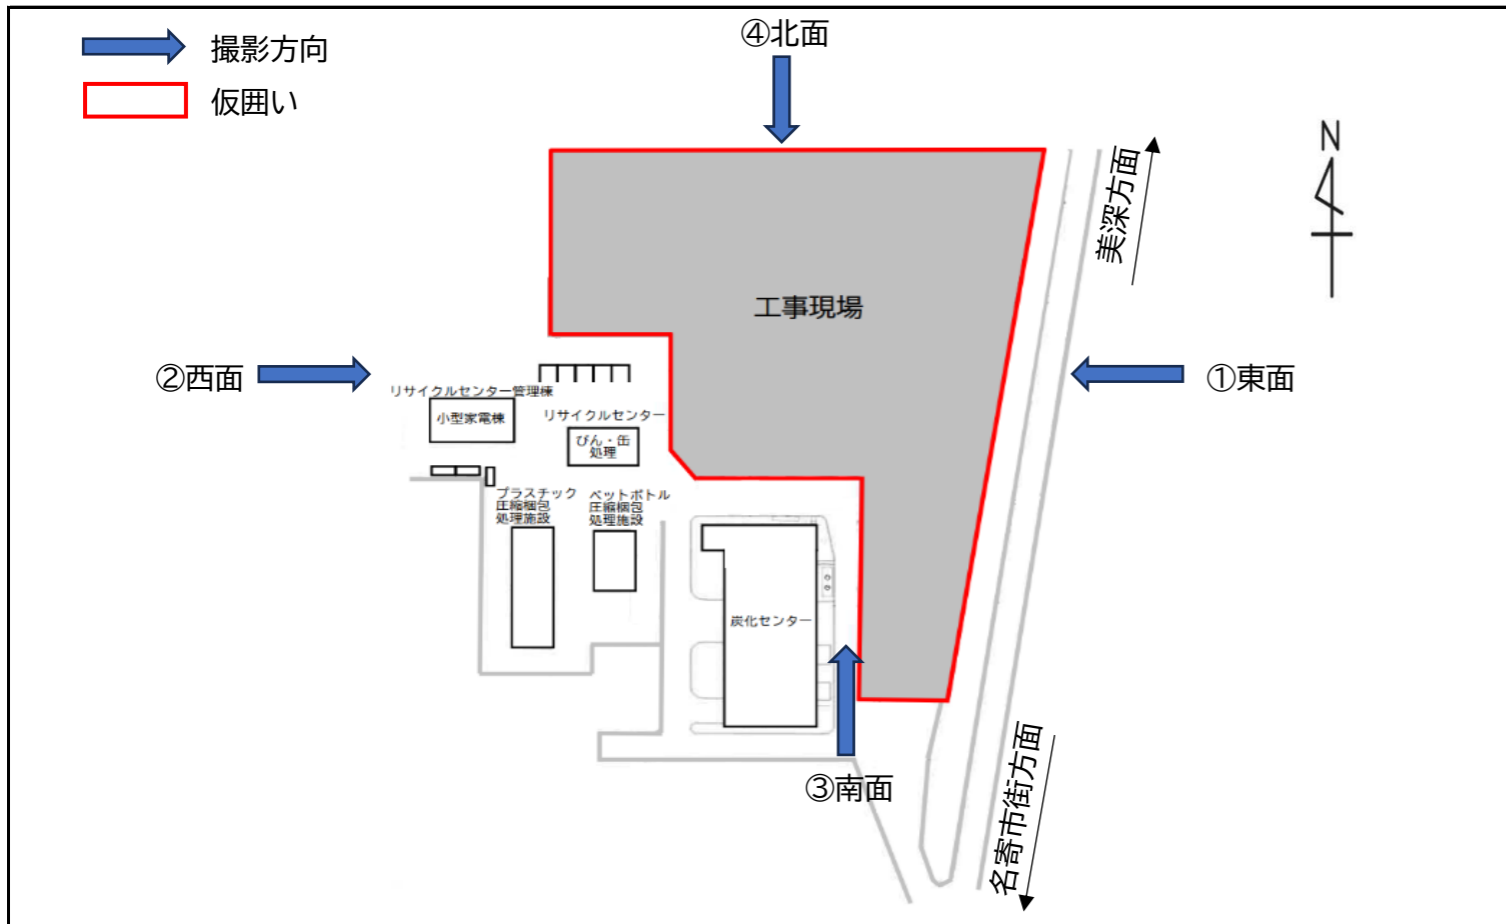

撮影箇所：②西面上空



令和6年10月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：③南面上空



撮影箇所：④北面上空

