

令和6年7月末現在建設工事進捗状況

工事名称	(仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事
工事場所	北海道名寄市字大橋140番地1及び146番地11
敷地面積	13,742.56 m ²
構造及び規模	鉄骨造、一部RC・SRC造、地上5階建
建築面積/延床面積	2,705.43 m ² / 5,012.34 m ²
契約工期	令和5年9月25日 から 令和9年3月12日 まで

【今月の主な作業】

[準備工]


- ・ 歩道切下げ工事、仮囲い組立
- ・ 仮設浄化槽工事、場内鉄板敷き込み
- ・ 改良試験材採取
- ・ 仮設事務所組立・備品搬入・配管・配線
- ・ 縄張り位置出し、杭芯位置出し
- ・ 朝礼看板設置
- ・ 安全祈願祭・起工式式典設営

実施出来高	1.09%	作業人員累計	月計 334 人	累計 508 人
-------	-------	--------	----------	----------

撮影箇所：①東面上空



工事記録写真（撮影日：令和6年7月31日）

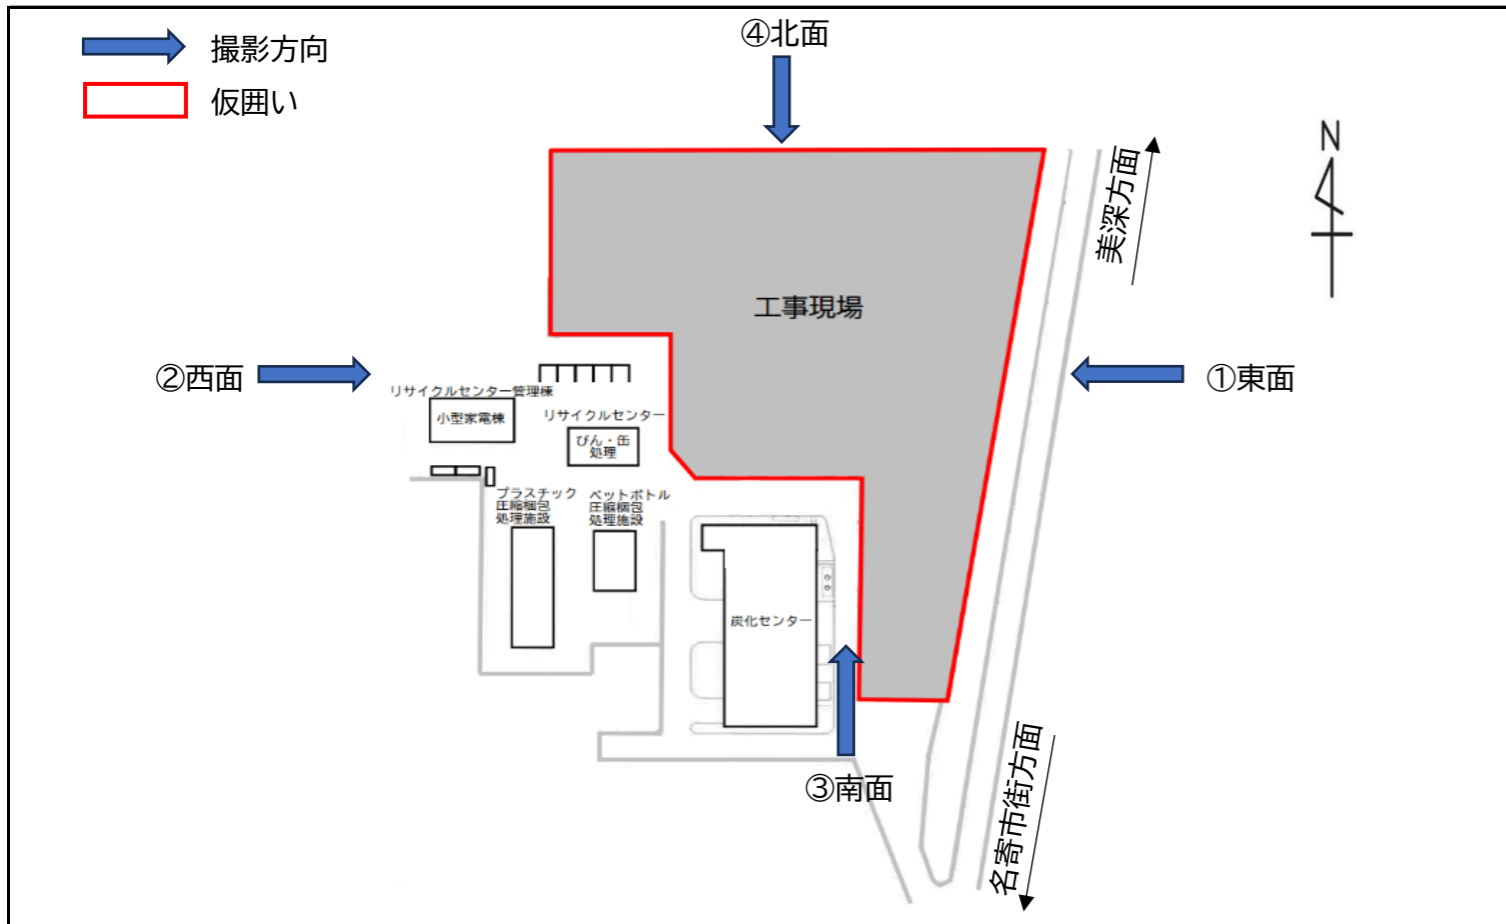

撮影箇所：②西面上空



令和6年7月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：③南面上空



撮影箇所：④北面上空

