

令和6年8月末現在建設工事進捗状況

| | |
|-----------|---|
| 工事名称 | (仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事 |
| 工事場所 | 北海道名寄市字大橋140番地1及び146番地11 |
| 敷地面積 | 13,742.56 m ² |
| 構造及び規模 | 鉄骨造、一部RC・SRC造、地上5階建 |
| 建築面積/延床面積 | 2,705.43 m ² / 5,012.34 m ² |
| 契約工期 | 令和5年9月25日 から 令和9年3月12日 まで |


【今月の主な作業】

[準備工]

- ・安全祈願祭・起工式
- ・縄張り、BM（ベンチマーク）確認、杭芯検査
- ・試験杭立会検査
- ・地盤改良杭打設、ごみピット掘削、仮設給排水開始
- ・ごみピット下杭芯検査

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-------|----|-------|--------|----|------|----|------|
| 月末出来高 | 予定 | 1.92% | 実施 | 1.92% | 作業人員累計 | 月計 | 252人 | 累計 | 760人 |
|-------|----|-------|----|-------|--------|----|------|----|------|

工事記録写真（撮影日：令和6年8月30日）

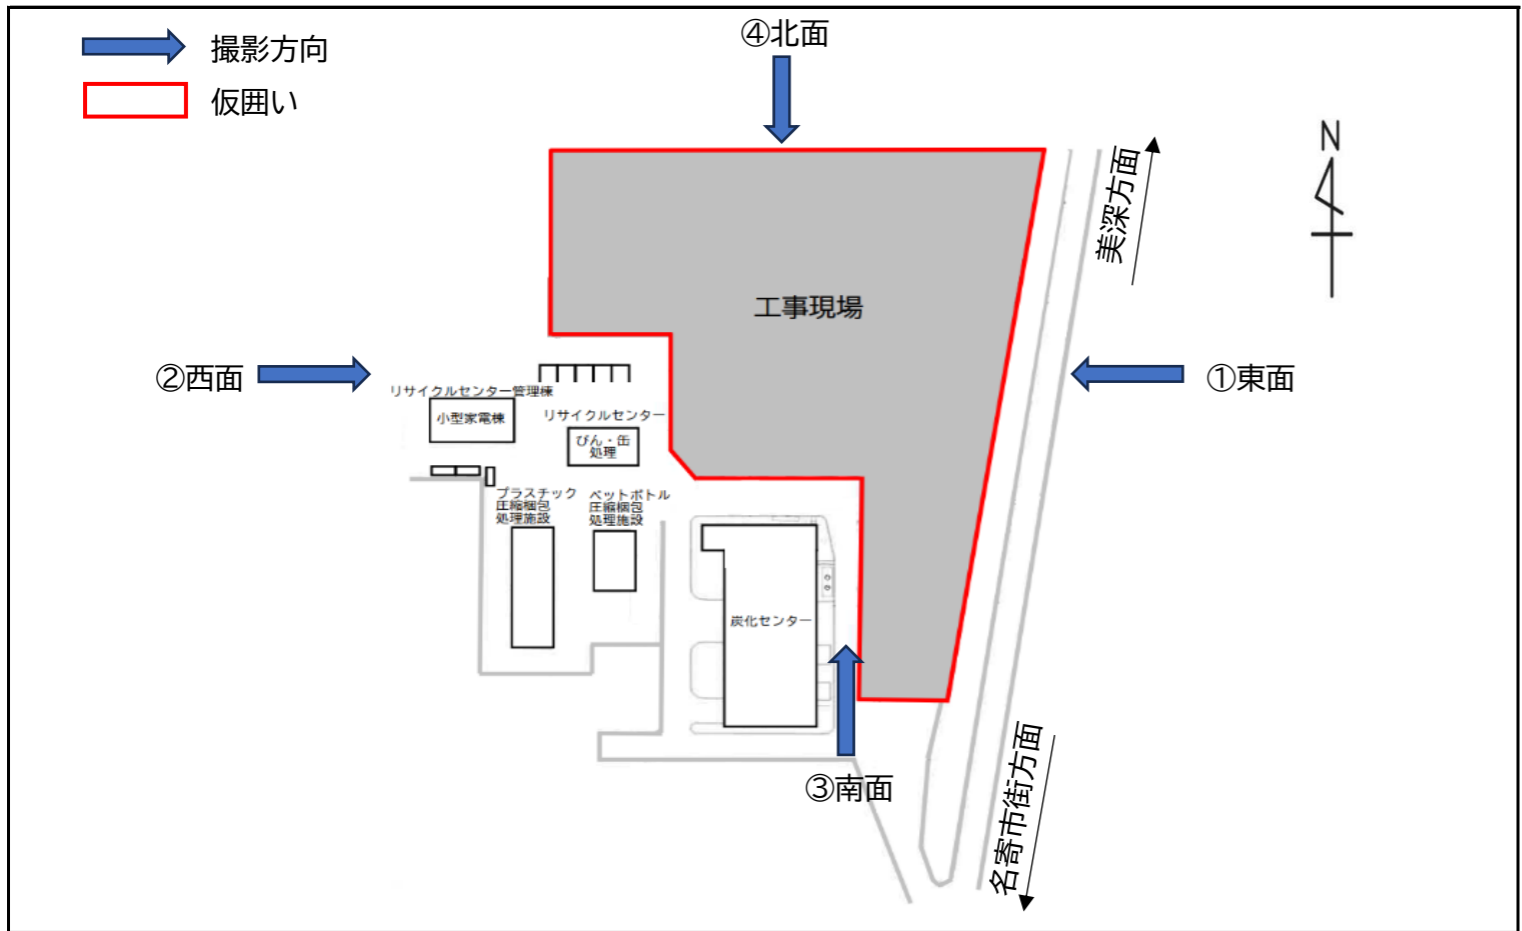

(仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事安全祈願祭・起工式
令和6年8月1日（木）午前10時



令和6年8月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：①東面上空



撮影箇所：③南面上空



撮影箇所：②西面上空



撮影箇所：④北面上空

